香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HANKING GOLD INTERNATIONAL LIMITED
罕王黃金國際有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03788)

內幕消息
Mt Bundy金礦項目
最新選礦冶金試驗結果及進展更新

本公告乃由罕王黃金國際有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文而發佈。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然報告Rustlers Roost金礦床歷史廢石堆區域近期鑽探樣本的選礦冶金試驗結果，並就後續鑽探計劃以及位於澳洲北領地的Mt Bundy金礦項目(「**該項目**」)建設進展提供最新情況。

- 對整個歷史廢石堆進行的首階段鑽探所取得礦化物料複合樣本，金回收率超過95%。目前正加快推進約700個反循環鑽孔、合共15,000米的後續鑽探，旨在界定符合JORC規範的新礦產資源量及礦石儲量。該廢石堆估計含有1,000萬噸氧化礦石，位於正在建設的選廠旁邊。

- 年處理量550萬噸礦石選廠的建設進展良好，交貨週期長的關鍵設備的供貨合同已授予或已訂購，大型土方工程也已取得進展。

- 運輸道路及258個房間的營地建設已提前完成，且在預算內。

- 尾礦庫(「**尾礦庫**」)的建設及採礦合同的招標進展良好。

- 目標於2027年第4季度進行選廠調試，於2028年第1季度首次產金。

最新選礦冶金試驗結果

如本公司於2026年8月21日公告所述，於Rustlers Roost金礦歷史廢石堆進行41個反循環鑽孔、共960米的首階段鑽探，發現了潛在可採氧化礦石。從該鑽探計劃製備了3份具代表性的複合樣本。這些選礦冶金試驗複合樣本取自整個廢石堆的反循環鑽孔樣品(圖1)。

獨立選礦冶金試驗在位於西澳珀斯的Bureau Veritas Minerals Pty Ltd實驗室進行。每份複合樣本均採用與Rustlers Roost選廠設計相一致的重選及氰化浸出工藝流程進行測試，磨礦粒度為P_{80} 75微米。

表1 Mt Bundy金礦項目最新選礦冶金試驗結果

複合樣本	重力回收率%	總回收率%	原礦品位克／噸金	尾礦品位克／噸金	氰化鈉千克／噸
MTW003	22.9	95.3	0.56	0.04	0.56
MTW004	47.5	96.9	0.42	0.02	0.58
MTW005	14.4	95.0	0.51	0.04	0.52
平均數值	28.3	95.7	0.50	0.03	0.55

該樣本的總金回收率介乎95.0%至96.9%，平均為95.7%(表1)，確認礦化物料的冶金性質均勻。該等結果要優於最終可行性研究(「**最終可研**」)所採用的約90%金回收率。值得留意，最新選礦冶金試驗乃按照該項目年處理量550萬噸礦石的Rustlers Roost選廠的設計及建設參數進行。

廢石堆後續鑽探計劃

繼2026年8月所公佈的首階段計劃取得成功後，我們正加快推進約700個鑽孔、合共15,000米的後續計劃(圖1)，旨在界定新的JORC資源量及礦石儲量。根據本公司的現場測量及初步計算，該歷史廢石堆約含有1,000萬噸氧化礦石。該廢石堆距離正在建設的年處理量550萬噸礦石選廠不到1公里(圖3)。

截至2026年11月4日，已鑽探超過10,000米，並向分析實驗室交付超過3,000個樣本進行化驗。在鑽探計劃完成，並從該鑽探計劃收到全部化驗結果後，首階段及該後續鑽孔的數據將由合資格人士按照JORC規範處理，以進行礦產資源量及礦石儲量估算。

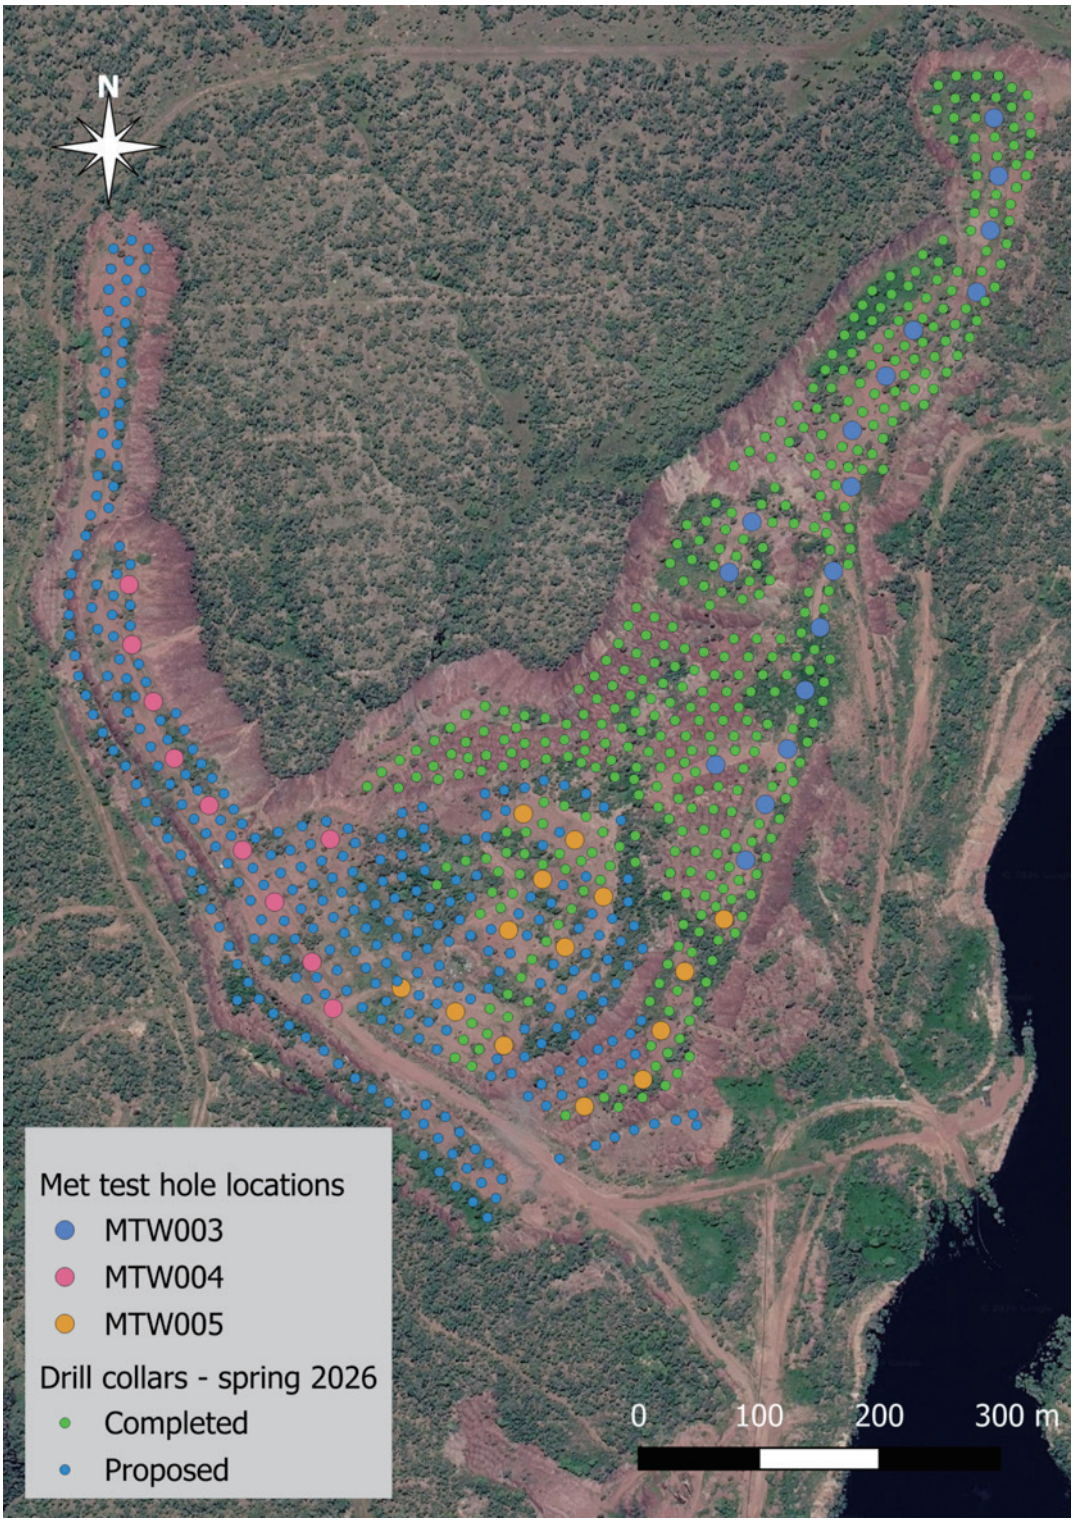


圖1 Mt Bundy金礦項目Rustlers Roost金礦床廢石堆上冶金試驗複合樣本及後續鑽孔的位置。

選廠建設進展

- 已鎖定交貨週期長的關鍵設備：繼18兆瓦球磨機合同授予中信重工及整套破碎篩分設備標段合同授予Metso後，本公司近期將重力回收標段授予Consep Pty Ltd。該重力標段包括兩台用於Rustlers Roost的KC-QS48重力選礦機及1台強化浸出反應器，以及1台用於Tom's Gully流程的KC-QS30重力選礦機、配套隔渣篩、控制系統、輔助設備，交付至達爾文港。

- 儲罐、混凝土、鋼結構、變壓器、高壓及配電室在招標及最終評標中。

- 進場道路及運輸道路建設已完成。

- 大型土方工程已授予Ostojic Group Pty Ltd（集團總部位於北領地達爾文）。該等工程正推進廠區平台及相關建設區域，進度領先於目標於2027年3月開工的混凝土工程。



圖2 Rustlers Roost選廠現場大型土方工程正在進行——Turkey Nest及運輸道路。



圖3 Rustlers Roost選廠現場大型土方工程正在進行(左上)。右側為歷史廢石堆，最新冶金試驗樣本自該處取得，超過15,000米、700個鑽孔的鑽探正於該1,000萬噸氧化礦石堆上進行。

258個房間住宿營地已完成

該項目258個房間住宿營地的建設已提前完成，且在預算內。已完成的營地提供計劃內隨土木、結構及工程進展而增加的建設工人所需的住宿及核心現場支持基礎設施。該營地亦將支持項目由建設過渡至調試及營運。每個房間均設有獨立淋浴間及洗手間，並配備電視、無線網絡、冰箱及空調。營地亦設有健身房、酒吧、食堂及其他設施(圖4)。







圖4 Mt Bundy金礦項目新近完成的258個房間住宿營地。

露天採礦及尾礦庫建設招標

露天採礦服務及尾礦庫建設的招標已展開。該流程已吸引澳洲及國際礦業承包商的強烈興趣，包括領先的澳洲公司及專業供應商。現場考察已於2026年10月26日完成，來自8家礦業承包商的15名代表出席，進行了深入、具體的技術及商業討論。

本公司正繼續評估投標者的技術、商業、安全及執行能力。目標於2026年第4季度選定露天採礦服務及尾礦庫建設標段的首選承包商。

後續行動

本公司擬於2026年第4季度完成廢石堆鑽探計劃(視乎最終化驗結果、技術評估及獨立專家可用情況而定),旨在於2027年第1季度按照JORC規範報告首次礦產資源量及礦石儲量。本公司目標為於2027年第2季度開始尾礦庫建設及採礦,於2027年第4季度進行選廠調試,於2028年第1季度首次產金。

談及有關進展時,本公司執行董事、首席執行官兼總裁邱玉民博士表示:

「我們非常高興看到,在正在建設的Rustlers Roost年處理量550萬噸礦石選廠的設計參數下,來自整個歷史廢石堆反循環鑽探的複合樣本的最新選礦冶金試驗結果,高於最終可研所採用的金回收率。我們正在加速推進在該歷史廢石堆(預估約1,000萬噸)上執行700個反循環鑽孔、15,000米的新鑽探。雖然仍需進行當前的高網度(17x17米)鑽探、化驗及獨立資源估算,惟該計劃正顯示該廢石堆有潛力成為當前礦產資源量或礦石儲量以外的、額外選廠進料的有用來源。由於該物料已經開採及破碎、呈氧化狀態,且毗鄰正在建設的選廠,我們預期其將提升生產營運靈活性,並為本公司股東創造重大價值。該計劃完成後,黃金生產計劃將得到優化。

進場道路及運輸道路、以及258個房間的營地建設已提前完成,且在預算內,年處理量550萬噸礦石選廠的交貨週期長的關鍵設備已經授予,選廠建設的大型土方工程進展理想。採礦及尾礦庫招標獲得各方踴躍響應,令我們有信心能夠及時遴選正確的合作交付方,並保持該項目於2028年第1季度實現首次產金的發展目標。」

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時,務請審慎行事。

承董事會命
罕王黃金國際有限公司
主席兼非執行董事
夏苗

中國上海,2026年11月4日

於本公告日期,本公司執行董事為邱玉民博士、張晶女士、湯文斌先生及張俊峰先生;本公司非執行董事為夏苗先生及趙延超先生;及本公司獨立非執行董事為王平先生、王安建博士、趙炳文先生及孫鐵民博士。
